



730-1

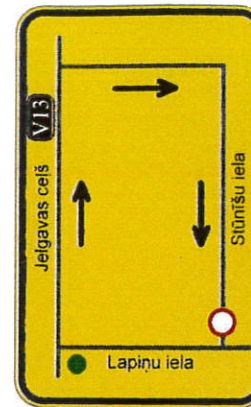

730-2

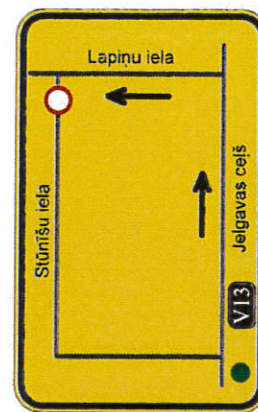

730-3

### SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma veiktību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI  
Rīgas nodaļas ceļu būvzinieris  
**Ģ. DUBINSKIS**


15.10.2020.

Mārupes novada  
Pašvaldības īpašumu pārvaldes  
ceļu būvzinieris

**U. Bārdulis**

15.10.2020

 118 Uzstādāmās ceļa zīmes


 Remonta zona

 Apbraucamais ceļš

 201 Esošās zīmes

#### Lokālā shēma A

ŠĶĒRSNORBEŽOJUMS - vienpusēgie vadstatņi maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusējas signālugunis.  
GARENORBEŽOJUMS - divpusēgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signālugunis uz katra otrā vadstapa.

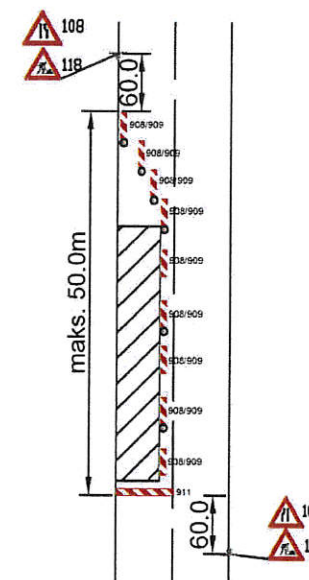

#### Piezīmes:

- Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
- Aprikojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
- Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
- Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
- Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltiņu ne mazāk kā 1,5m platu.
- Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
- Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
- Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
- Mehānismiem atrodies uz brauktuves, pielietot lokālo shēmu A.
- Pirms nobrauktuvi uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
- Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.

Būvdarbu vietas lokālais aprikojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.



OBJEKTS	ŪDENSĀIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA- 11.KVARTĀLS
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	<b>15.10.2020. - 20.10.2020.</b>
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Velve" Reģ. Nr. 40003064412 Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Aivars Smiltiņš 26427831
RASĒJUMS	Shēma Nr. 21: Stūnīšu iela
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501
