
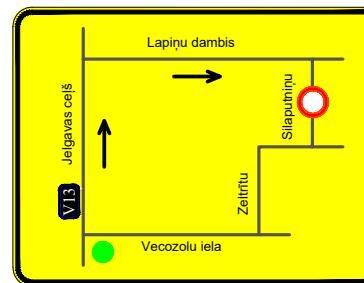
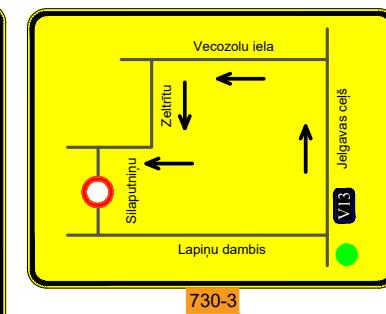
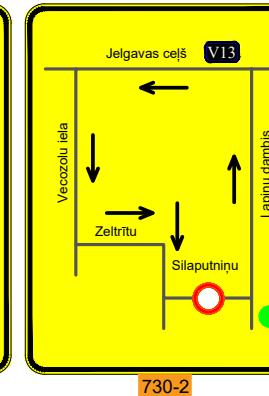


Piezīmes:

- Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
- Aprīkopjumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
- Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
- Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
- Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un paīgbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltīnu ne mazāk kā 1,5m platību.
- Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
- Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
- Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
- Mehāniem atrodeties uz brauktuves, pielietot lokālo shēmu A.
- Pirms nobrauktuvju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
- Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.

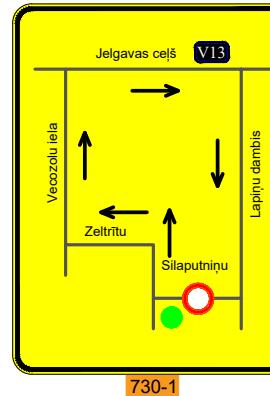

#### SASKANOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un nonemšanu attiecīs uz to izvietojuma atbilstību normatīviem aktem celu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodalas ceļu būvinženieris  
Girts Dubiņķis 15.03.2021. 4.3.1/3335 LS/5

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.




Remonta zona


Apbraucamais ceļš

Esošās zīmes

**Lokāla shēma A**  
SKERSNOBEBĀZOJUMS -vienspusīgie vadstatņi maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienspusīgas signālsliezenis.  
GARENNOBEBĀZOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signālslieze uz katru otru vadstāvu.



Būvdarbu vietas lokāla aprīkojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.



OBJEKTS	ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA- 11.KVARTĀLS
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	<b>14.03.2021. - 14.04.2021</b>
BŪVUZNĒMĒJS	SIA "Velve" Reg. Nr. 40003064412 Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Aivars Smiltiņš 26427831
RASĒJUMS	Shēma Nr. 22: Silaputniu iela
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501
