

Piezīmes:

1. Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
2. Aprīkopjumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
3. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotajiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
5. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltīju ne mazāk kā 1,5m platu.
6. Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
7. Shēmas uzstādīšanas un demontažas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
8. Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
9. Mehānismiem atrodotos uz brauktuves, pielietot lokālo shēmu A.
10. Pirms nobrauktuju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
11. Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.


SASKANOTS

Saskanojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzeklu uzstādīšanu un nopēmēšanu attiecīs uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77. "Ievelot CSN 262.p. prasības un nodrošināt piebraukšanas iespējas.


VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodalas ceļu būvinženieris Girts Dubinskis 06.04.2021 4.3.1/4530

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Lapa 3/3

Lokāla shēma A
ŠĶĒRSNORBEŽOJUMS -vienpusīgie vadstatni maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusīgas signāluzīmis.
GARENNORBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatni maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signāluzīms uz katra otrā vadstāvu.

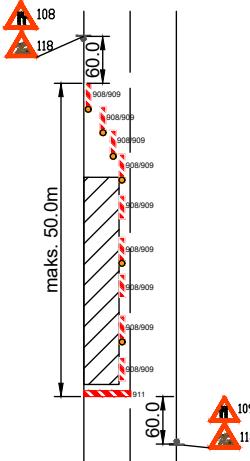

Būvdarbu vietas lokāla aprīkojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.



118 Uzstādāmās ceļa zīmes

Remonta zona

201 Esošās zīmes

OBJEKTS	ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA- 11.KVARTĀLS
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	06.04.2021. - 06.05.2021.
BŪVUZNĒMĒJS	SIA "Velve" Reg. Nr. 40003064412 Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Aivars Smiltiņš 26427831
RASĒJUMS	Shēma Nr. 17: Ventas iela
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501
