

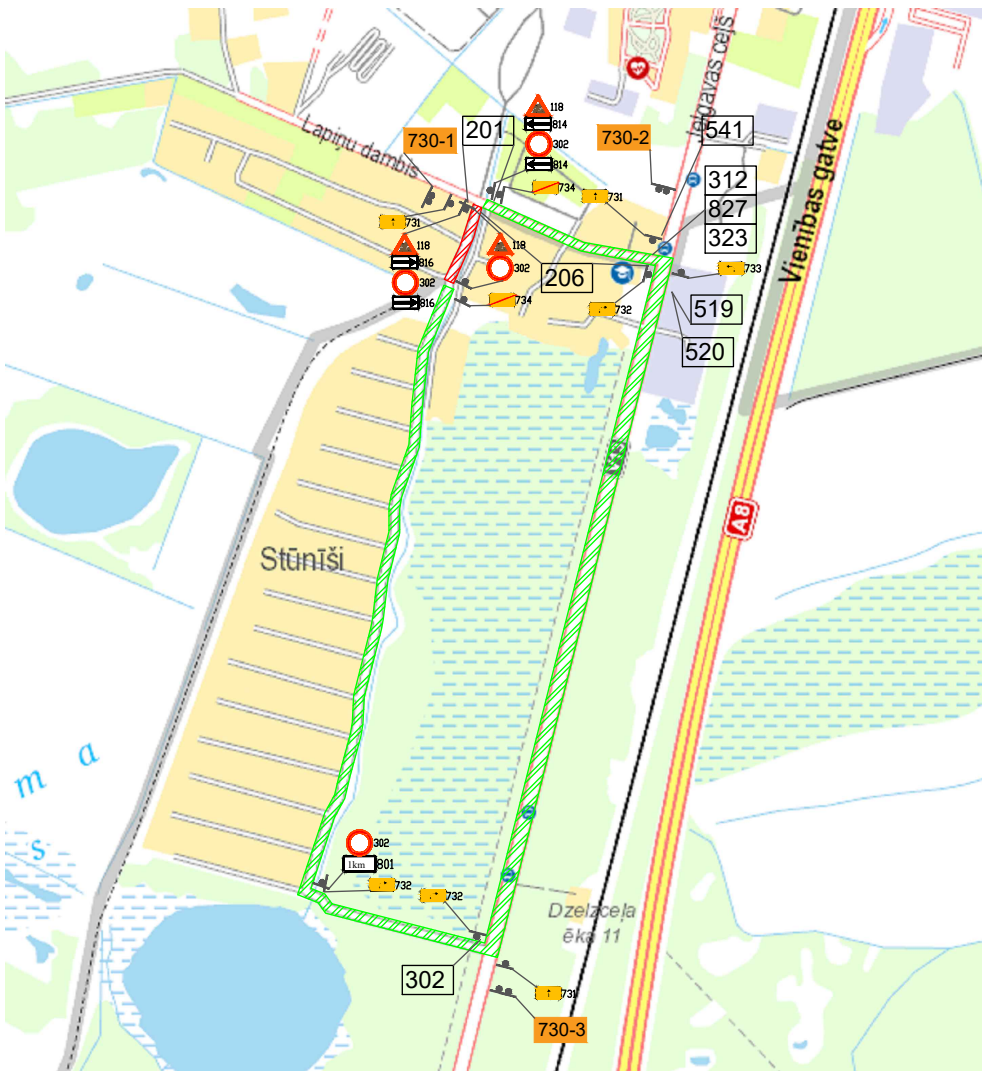





Piezīmes:

1. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
2. Aprikojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
3. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļējiem.
5. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltiņu ne mazāk kā 1,5m platu.
6. Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
7. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
8. Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
9. Mehānismiem atrodoties uz brauktuves, pielietot lokālo shēmu A.
10. Pirms nobrauktuvju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
11. Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.


Būvdarbu vietas lokālais aprikojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.



730-1



730-2



730-3


 118 Uzstādāmās ceļa zīmes

 Remonta zona

 Apbraucamais ceļš

 201 Esošās zīmes

Lokālā shēma A
ŠKĒRSNORBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusīgas signāllūgus.
GARENORBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signāllūgums uz katra otrā vadašpā.



OBJEKTS	ŪDENSĀIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA- 11.KVARTĀLS
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	08.09.2020. - 08.10.2020.
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Velve" Reģ. Nr. 40003064412 Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Aivars Smiltiņš 26427831
RASĒJUMS	Shēma Nr. 21: Stūnīšu iela
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501
