




SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.


VAS LATVIJAS VALSTS CEĻU
Inženieru nodaļas ceļu būvzinieks

S. ALVIZINA

01.12.2016.

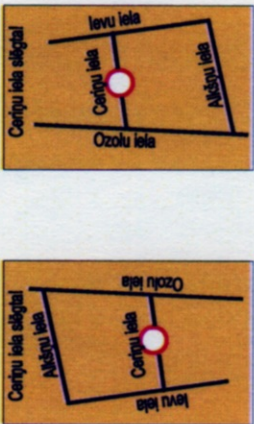

730-1



730-2

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienā.
Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un akritumu izveidojējiem.
Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signālleņiem un palīgburietiem.
Esošās ceļa zīmes nav paredzētas demontāžai/izkļāst.
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fileēt būvdarbu žurnālā.
Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
Būvdarbus paredzēts veikt uz nomales, pielietojot lokālo shēmu Nr. 17A. Šķērsojot brauktuvi ar atklāto metodi, paredzēts pielietot shēmu Nr. 17 B.
Pirms būvdarbu uzsākšanas iedzīvotāji tiks informēti par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ugunsdzēsības sistēmas attīstība 1.kārta.
	Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	05.12.2016. - 10.01.2017.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K. Ulmaņa gatve 119, Mārupes, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Ceriņu ielā, Jaunmārupē.
IZSTRĀDĀJA	Shēma Nr. 18
