



#### SASKĀNOTS


Saskānojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un nonēšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstoši normatīviem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādit atbilstoši standartam LVS 77. \*leverbrot CSN 262.p. prasības un nodrošināt piebraukšanas iespējas.

VSA "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodalas ceļu būvinženieris Ģirts Dubiņskis 06.04.2021 4.3.1/4530

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.  
Lapa 2/3

#### Lokālā shēma A

ŠĶĒRSNORBEŽOJUMS -vienpusīgie vadstatni maks. 2m attālumā cits no citā, slīpumā 1:3 pret brauktuvē malu. Vismaz 3 vienpusīgas signāluzīmas. GARENNORBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatni maks. 10m attālumā cits no citā. Ieteicama divpusīga signāluzīms uz katrā otrā vadstaņa.

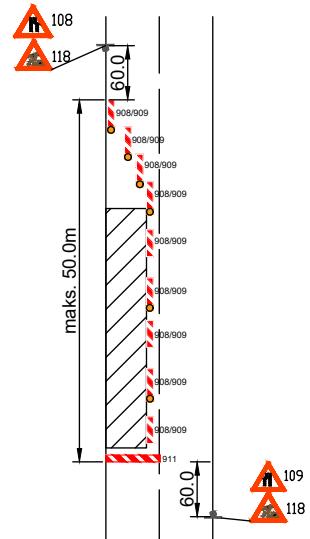

118 Uzstādāmās ceļa zīmes

Remonta zona

201 Esošās zīmes

#### Piezīmes:

- Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
- Aprīkopumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
- Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
- Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
- Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un paliņbarjerām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltīnu ne mazāk kā 1,5m platu.
- Esošas ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
- Shēmas uzstādīšanas un demontažas laikus fiksēt būvdarbu žurnālu.
- Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
- Mehānismiem atrodieties uz brauktuvē, pielietot lokālo shēmu A.
- Pirms nobrauktuvju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
- Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| OBJEKTS                    | ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA<br>ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA             |
| BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS   | 06.04.2021. - 06.05.2021.  |
| BŪVUZNĒMĒJS                | SIA "Velve"<br>Reg. Nr. 40003064412<br>Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046 |
| ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS | Aivars Smiltiņš 26427831   |
| RASĒJUMS                   | Shēma Nr. 33: Šosciems   |
| IZSTRĀDĀJA                 | SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501                           |
