



730-1



730-2

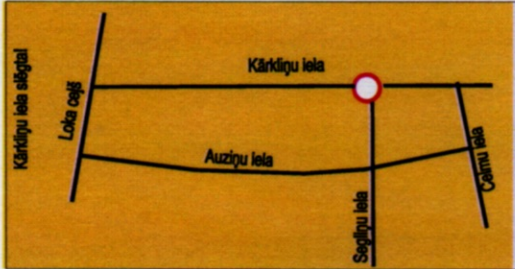

730-3

SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Rīgas nodaļas ceļu būvīnženklere
S. AUZIŅA

08.12.2016

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļiem.
Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvdarbes norobežot ar signāllentām un palīgburēm.
Esošās ceļa zīmes nav paredzētas demontāžai/ai. Šēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus tiks veikti būvdarbu žurnāli. Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 +302+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	08.12.2016 - 10.01.2017.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Auziņu un Segliņu ielās, Jaunmārupē. Shēma Nr. 20
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"
