



730-1

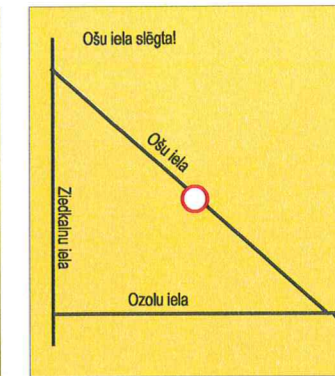

730-2

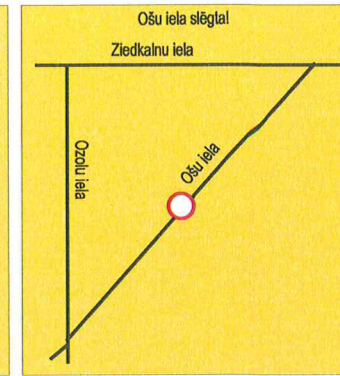

730-4



730-3

## SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻU  
Rīgas nodaļas ceļu būvīnženiere  
**S.AUZIŅA**  
20.09.2016.

**JURIJS KORŅEVS**  
Mārupes novada Domes  
ceļu būvīnženieris

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās. Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā. Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 +302+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	26.09.2016.-21.12.2016.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Ošu ielā, Jaunmārupē. Shēma Nr. 4
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"
