
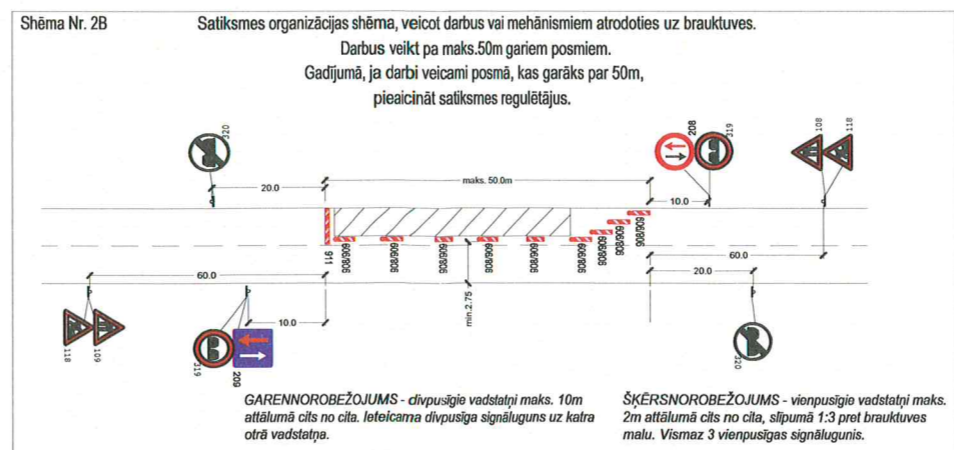


SASKAŅOTS
Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Rīgas nodaļas ceļu būvīnženiera
S. AUZIŅA
20.09.2016

JURIJS KORŅEVS
Mārupes novada Domes
ceļu būvīnženieris
20.09.2016

Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās. Shēmas Nr. 2A un 2B izmantot, veicot būvdarbus Loka ceļa brauktuves malā un uz nomales. Aprikojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbārjerām. Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā. Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 +302+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

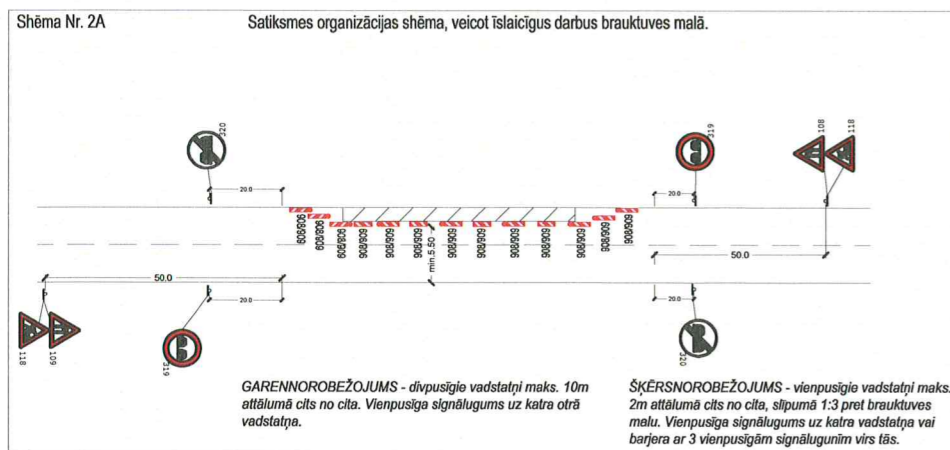

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	26.09.2016.-01.02.2017.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASEJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Priēžu un Rudzu ielās, Jaunmārupē. Shēma Nr. 2
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"
